



Sektor za obnovu, razvoj, monitoring i regionalne centre

Pregled osnovnih pokazatelja Zajedničkih projekata dobrenih na osnovu budžeta iz 2008. i 2009. godine

Realizacijom Odluka Komisije za raseljene osobe i izbjeglice BiH u toku 2008. i 2009. godine, ukupno je pokrenuto oko 428 projekata različitih namjena u ukupno 118 općina/opština na cijeloj teritoriji BiH.

Do sada je u potpunosti završeno 242 projekta, a očekuje se završetak svih aktivnosti za ukupno 74 dodatna projekta.

U toku 2009. godine je završeno/sanirano i useljeno: ukupno 332 stambene jedinice/podružice u ukupno 18 općina (izuzev CEB projekta), 29 zgrada (izuzevši grad Mostar) sa ukupno 89 saniranih stambenih jedinica u ukupno 13 općina, priključeno 180 povratničkih objekata na NN mrežu u ukupno 16 općina, sanirano 110 putnih pravaca, vodovoda, vjerskih objekata i projekata zapošljavanja.

PROJEKAT ZP08

Od 01.01.2010. godine je obavljen tehnički prijem i primopredaja radova za ukupno 298 stambenih jedinica/podružice u ukupno 22 općine (izuzev CEB projekta), pet zgrada za 13 direktnih korisnika i 7 indirektnih korisnika, priključeno na elektromrežu 121 stambena jedinica u 7 općina, sanirana jedna putna komunikacija i jedan vodovod u 2 općine.

PROJEKAT ZP09

Od 01.01.2010. godine je obavljen tehnički prijem i primopredaja radova za ukupno 10 stambenih jedinica/podružice u ukupno jednoj općini (izuzev CEB projekta), četiri zgrade za 30 direktnih korisnika i 45 indirektnih korisnika, priključeno na elektromrežu 17 stambenih jedinica u 2 općine, završena 44 projekta iz oblasti održivog povratka (putne komunikacije, vodovodi, vjerski objekti).

PROJEKAT ZP10

U toku 2010. godine su odobreni projekti elektrifikacije objekata realizovanog povratka, sanacije individualnih stambenih jedinica i sanacije kondominijuma. Sa svim općinama su potpisani Memorandumi o razumijevanju i u toku je realizacija i ovih projekata.

Projekat sanacije individualnih stambenih jedinica: od ukupno 84 općine, do sada je ukupno 24 općine raspisalo Javni poziv za odabir korisnika u dnevnim novinama i to: Banja Luka, Bos. Krupa, Bratunac, Brčko distrikt, Drvar, Foča-Ustikolina, Bos. Gradiška, Jajce, Kotor Varoš, Lukavac, Maglaj, Milići, Modriča, Olovo, Ribnik, Sanski Most, Šipovo, Travnik, Tuzla, Zavidovići, Vlasenica, Ilijaš, Foča, Srebrenica.

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA ZA ZAJEDNIČKE PROJEKTE ODOBRENE U 2008. I 2009. GODINI

Namjena sredstava/budžetska godina	Odobreni budžet u KM	Ukupno ugovoreno/procent ugovorenog u odnosu na ukupan budžet uključujući i realizovano	Završeni projekti (obavljen tehnički prijem radova)	U toku radovi i očekuje se završetak projekata
1	2	3	4	5
Zajednički projekti 08				
Individualne stambene jedinice	21.800.000,00	18.827.855,00	14.331.749,77	3.017.791,83
Kondominijumi	7.750.000,00	7.214.489,00	6.321.491,22	865.598,20
Elektrifikacija	3.233.300,00	3.187.417,00	1.886.597,66	1.300.819,14
Održivi povratak	4.998.000,00	4.950.755,00	4.183.498,61	575.000,00
Sveukupno 2008.	37.781.300	34.180.516,00	26.723.337,26	5.759.209,17
Zajednički projekti 09				
Individualne stambene jedinice	20.212.000,00	1.502.519,99	224.000,24	300.000,00
Kondominijumi	3.960.000,00	2.882.958,63	1.152.022,99	1.716.445,64
Elektrifikacija	5.491.512,00	4.506.443,24	571.106,67	2.827.453,86
Održivi povratak	8.633.000,00	6.819.330,68	5.104.321,57	1.020.000,00
Sveukupno 2009.	38.296.512	15.711.252,54	7.051.451,47	5.863.899,5
Sveukupno iz 2008/09	76.077.812,00	49.891.768,54	33.774.788,73	11.623.108,67


Kolona 2: Odobren budžet po Odlukama Komisije za raseljene osobe i izbjeglice BiH;

Kolona 3: Ukupno ugovoreno uključujući i realizovane projekte, kolona 2. Procenat se odnosi na ugovoreno prema ukupnim odobrenim sredstvima.


Kolona 4: Ukupan budžet projekata koji su završeni (obavljen tehnički prijem radova)

Kolona 5: Vrijednost projekata čija je sanacija/rekonstrukcija u toku. Završetak ovih projekata se planira prema stepenu gotovosti radova, od danas pa najkasnije za 3 mjeseca, u skladu sa ugovorenim rokovima. Većina projekata ima jako visok stepen završenosti radova iznad 80%, što znači da će iste za oko mjesec dana završiti sa radovima (u skladu sa vremenskim prilikama).


ZP08

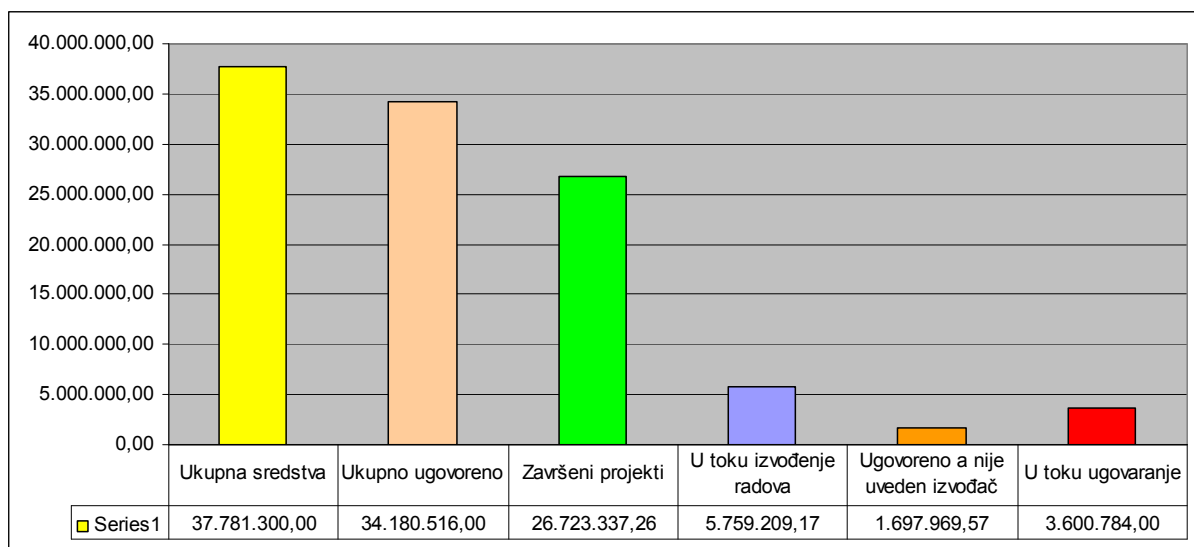

ZP09

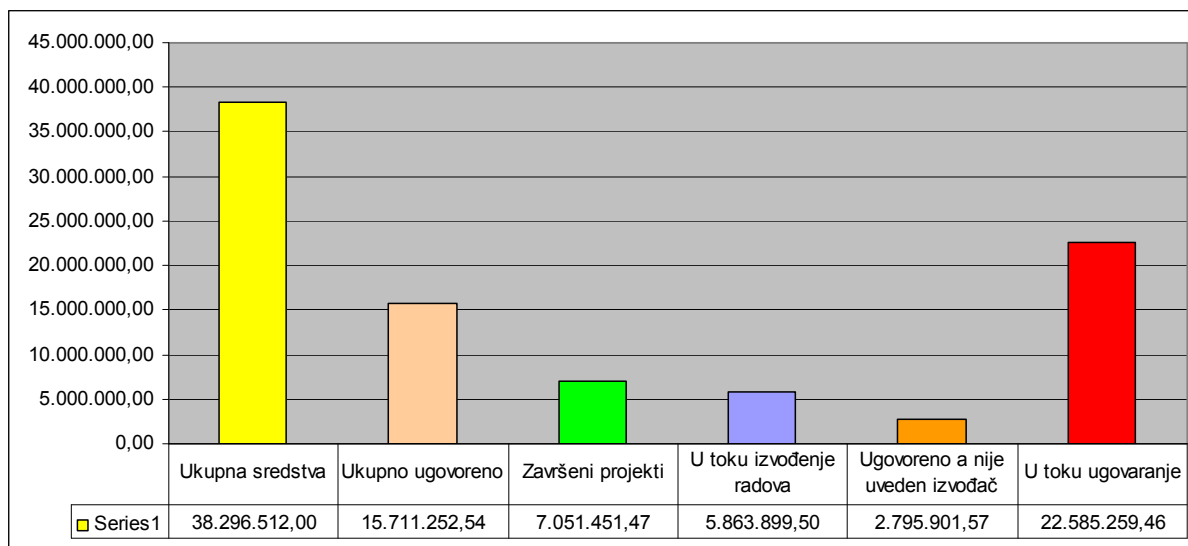

ZP08 i ZP09

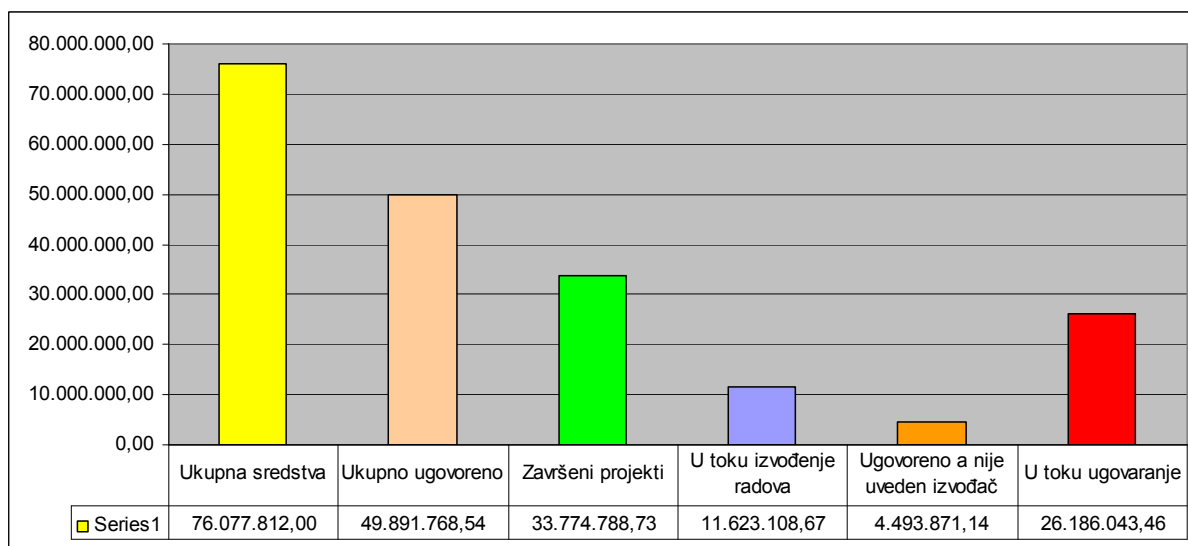

Od ukupno odobrenih sredstava 76.077.812 KM, do sada je ukupno ugovoreno 49.891.768,54 KM ili 65%. Ukupno je završeno 242 projekata u vrijednosti od 33.774.788,73 KM ili 44%, a u toku je izvođenje radova na još 74 projekta u vrijednosti 11.623.108,67 KM.
